



Upitnik Monithon na hrvatskom jeziku

Travanj 2020.

1. korak – Uredska analiza

Osnovne informacije

URL/ID projekta: <https://www.zadarbastini.hr/>

Naslov: Zadar Baštini

Autor: Grad Zadar

Opis projekta koji istražujete: projekt koji smo odlučili istraživati je usmjeren na očuvanje, ponovno oživljavanje i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra. Također je usmjeren na zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva i turista. Osnovna namjera projekta je promocija grada Zadra kao kulturno-turističke destinacije kako bi se posredno time pridonijelo otvaranju novih radnih mjesta i jačanju gospodarskog razvoja Zadra.

Projekt je dio većeg projekta određenog područja? Ako jest, koji je sveobuhvatni cilj tog plana? Projekt „Zadar baštini“ sastoji se od 4 komponente: Provedurova palača, Bedemi zadarskih pobuna, Jačanje kapaciteta i Promocija destinacije. Učenici Gimnazije Franje Petrića orijentirali su se na dio obnove **Bedema zadarskih pobuna** nastalih u spomen jedanaest krvavih buna koje su građani Zadra digli protiv Mletačkih vlasti. Bedemi su izgrađeni u 12 i 13. st. . Nakon toga, tijekom 16. st. su dodatno ojačani radi obrane od strane turskih osvajača. Značajni dio bedema je sačuvan no, s vremenom se pojavila potreba za obnovom i ponovnim oživljavanjem tog prostora u samom središtu grada (na poluotoku). Dio projekta koji mi istražujemo usmjeren je na obnovu bedema u istočnom dijelu grada.

Referentno mjesto projekta

ŠTO TREBAM OVDJE NAPRAVITI? Potrebne su nam koordinate zemljopisne širine i dužine projekta koji istražujete! Ako upišete adresu koja je najbliža mjestu terenskog posjeta i kliknete na tipkalo s povećalom, karta će se centrirati i pokazat će se oznaka na tom mjestu. Ako je potrebno, moguće je povući oznaku po karti da biste bili još precizniji u postavljanju položaja oznake (a time i lociranju koordinata!)

44.117978478148814

15.224491953849794



2. korak – Vrednovanje

Načini istraživanja

Budući da su nam, radi situacije s koronavirusom, ograničene mogućnosti i nismo u mogućnosti bili odraditi sve susrete s ispitanicima. Izlazak na teren smo odradili sami te smo teren fotografirali i snimili video zapis. Intervjue smo većinom odrađivali putem video poziva (Skype, Whats App video-pozivi), telefonskih razgovora ili elektroničkom poštom. Sve smo dodatno snimili videom.

Prikupljanje informacija

- Prikupljanje informacija na mreži
- Izravan posjet dokumentiran fotografijama i videozapisima
- Intervju s lokalnim političkim predstavnicima
- Intervju s nadležnim tijelom za upravljanje projektom
- Intervju s ispitanicima koji su osmislili projekt
- Intervju s ispitanicima koji su pokrenuli ili pokreću projekt (pokretač ili izvoditelj)
- Intervju s korisnicima usluga projekta
- Intervju s ostalim osoba

Tko je intervjuiran? Koju ulogu ima ta osoba u projektu? (npr. upravitelj/administrator, općinski službenik, informirani građanin...) – navedite uloge svih intervjuiranih osoba

Ante Ćurković i Stefani Mikulec Perković - Grad Zadar: Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za EU fondove i Voditeljica Odsjeka za provedbu ITU Mehanizma

1. pitanje: Jeste li naišli na neke poteškoće prilikom provedbe projekta? Npr. kašnjenje projekta.

Odgovor: Problema uvijek ima i problemi su dio našeg svakodnevnog rada. Od njih ne treba bježati, nego zajedničkim timskim radom ih pokušati riješiti na najbolji mogući način. Prepreka na koju smo naišli već u početnoj fazi projekta je vezana uz jednu lijepu vijest, a ta je da su bedemi došli pod zaštitu UNESCO-a. Dakle, jedan veliki dio dokumentacije koji smo prije toga odradili trebao je biti izmijenjen jer je zaštita bedema tražila prilagodbu procedure. Sve intervencije koje su se radile na bedemima morale su imati dozvolu Ministarstva kulture, koji su nam sada jedan vrlo važan partner u projektu.

Sljedeći problemi vezani su uz situaciju s koronavirusom, a taj dio je svima poznat.

2. pitanje: Možete li nam reći da li je projekt dobro isplaniran u financijskom smislu?

Odgovor: Da. U projektu smo predvidjeli dovoljno novaca, što je pokazao i postupak javne nabave. Unutar budžeta projekta je ostalo još nešto novaca (za naknadne troškova na gradilištu, što je uobičajeno). Kad je riječ o višegodišnjim projektima ponekad je teško odmah uskladiti troškove projekta s proračunom. Proračun projekta treba uskladiti s



proračunom jedinica lokalne samouprave i planirati višegodišnje financiranje. Projektni tim treba na početku projekta isplanirati koliko će se koje godine trebati odvojiti sredstava. U fazi kad se izvode radovi Grad treba imati mogućnost financiranja i do 6 mjeseci unaprijed prije nego što dobije povrat sredstava iz EU. To znači da Grad u jednom trenu financira projekt unaprijed i nakon 6 mjeseci dobije povrat novca.

Marija Bosnić- ZADRA NOVA: Voditeljica odsjeka za strateško planiranje i koordinaciju razvoja Zadarske županije- priprema projektne prijave.

1. pitanje: Koja je uloga ZadraNove u organizaciji i provedbi projekta Zadar Baštini?

Odgovor: Agencija ZadraNova je zajedno s Gradom Zadrom pripremila projekt „Zadar Baštini“. Projekt je uspješno prošao sve faze ocjenjivanja i potpisan je ugovorom dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova. Zaduženi smo za aktivnosti promidžbe (početna i završna konferencija) i vidljivosti (mrežna stranica i logo).

2. pitanje: Jeste li zadovoljni dosadašnjim odvijanjem projekta s obzirom na planirane termine i financijski plan?

Odgovor: Da. Zadovoljni smo sadašnjim tijekom projekta i uspjehom povlačenja sredstava iz EU fondova. Provedba radova se odužila radi složenih postupaka nabave do 14. prosinca 2020., no sve su to situacije koje se na ovako velikim projektima događaju i nisu neuobičajene. Vodi se računa i o održivosti projekta. Tu govorimo o post-projektnoj fazi. To konkretno znači da je obaveza 5 godina nakon završene obnove bedema slati izvješća o tome kako je projekt zaživio u zajednici. Nama je u fokusu prvobitno interes građana Zadra, utjecaj obnove bedema na svakodnevni život i poboljšanje kvalitete života naših građana.

Barbara Peranić- KONZERVATORSKI ODJEL ZADAR- nadzor nad građevinskim istraživanjima

1. pitanje: Koja je uloga konzervatora u obnovi bedema? Kažu da su konzervatori jedan od „krivaca“ za kašnjenje projekta.

Odgovor: Posao konzervatora je zaštititi i očuvati sva svojstva i vrijednosti koja građevinu čine kulturnim dobrom, kako bi ostale nasljeđe budućim generacijama. U slučaju zadarskih gradskih bedema, Muraja, to je i izvanredna univerzalna vrijednost (outstanding universal value) zbog koje su upisani na listu svjetske baštine. Konzervatorska služba radi provodeći Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ostale propise koji se na njih odnose.

Uloga konzervatora počinje prije izrade samog projekta, kada na osnovu ideje investitora, odnosno naručitelja, i arhitekta dajemo posebne uvjete zaštite kulturnog dobra. Cilj tih uvjeta je, osim očuvanja, sanacija i poboljšanje općeg stanja građevine. Mi smo dali posebne tako i uvjete za ovaj projekt te smo odbili potvrditi prvu verziju projekta radi pretjeranog naglašavanja atraktivnosti koja na baštini nije potrebna. Nakon toga smo napisali nove uvjete koji su prihvaćeni. Dalje sudjelujemo u cijelom procesu izrade projekta, razgovarajući



i upućujući projektanta kod svih prijedloga i problema, te na koncu potvrđujemo da je projekt u skladu s našim uvjetima. Kod samih radova pratimo njihovo izvođenje u svakom segmentu, posebno ukoliko se pojavi nešto do tad nepoznato.

2. pitanje: Što biste izdvojili kao najslabiju kariku u obnovi bedema? Nešto što je najveći problem za obnovu?

Odgovor: Kao najslabiju kariku u obnovi izdvojila bih činjenicu da se u ovom projektu zapravo ne radi o cjelovitoj obnovi bedema, već zapravo samo o rekonstrukciji njegove gornje, do sada prometne, a u budućnosti pješačke površine. Zahvat se odnosi samo na prostor između ogradnih zidova, a ne tretira same bedeme, kako kamenom zidane pokose kortina, tako ni bastione, portale na vratima sv. Roka i Novim vratima, niti unutrašnje prostore nekadašnjih skloništa, a danas komercijalnih prostora. Osim toga, stabla crnika će u budućnosti predstavljati problem budući da ta stabla nisu održavana, zapuštena su te korijenje ulazi u strukturu zida.

Kao najveći problem u radovima pokazao se nedostatak prethodnih istražnih radova. Iako su navodi u medijima bili da projekt kasni radi arheoloških radova, moram reći da to nije istina. Arheološki radovi su započeli paralelno s građevinskim radovima.

Bogdan Marov- Arhitektonski studio „Rene“: osmišljavanje parternog uređenja bedema

1. pitanje: Kako zamišljate kućice koje će se nalaziti na bedemima? Hoće li to biti samo novi kafići kojih već ima prilično po gradu?

Odgovor: Konzervatorski uvjeti su bili takvi da se na bedemu ne smije ništa graditi, dakle ništa ne smijemo dignuti iznad nivoa partera. Kućice će biti drvene i nalazit će se samo na Bastionu Sv. Roka iznad tržnice. Tamo će ih biti deset. Postavljene u parovima. Ideja je da se u tim kućicama predstave lokalni proizvođači i prezentiraju svoje proizvode. Riječ je o autohtonim domaćim proizvodima i eventualno suvenirima.

Nama je prvenstveno u interesu da građani prepoznaju vrijednost ovog projekta za njihovu svakodnevnicu, kao prostor u kojem će oni s obiteljima moći boraviti, a koji neće biti prometnica kao što je to sad. Sve kasnije što ćemo ponuditi turistima u tom pravcu je još dodana vrijednost. No, građani i njihova kvaliteta života su nam u prvom planu.

2. pitanje: Jesu li se troškovi projekta zadržali u očekivanim okvirima? U medijima možemo pročitati kako je realna cijena puno veća od planirane?

Odgovor: Jesu, troškovi su unutar očekivanih. Nama se dogodio rijedak slučaj. Mi naime u sklopu projekta moramo dati procijenjenu vrijednost radova temeljem troškovnika. Potom investitoru dajemo očekivanu vrijednost radova radi raspisa javne nabave. Od četiri dobivene ponude, tri su bile u okviru naše procijenjene vrijednosti, što je za današnje vrijeme čudo. Dakle, ugovorena vrijednost je manja od procijenjene vrijednosti.



Mihovil Kardum- Minigradnja, d.o.o.: voditelj radova

1. pitanje: Jeste li zadovoljni dosadašnjim tijekom obnove bedema? Uspijevate li pratiti planirane rokove?

Odgovor: S obzirom na sve u uvjete do sada, a moramo uzeti u obzir da smo imali kišne dane dva mjeseca prošle godine, prilično smo zadovoljni. Kiša nas nije usporila, ali nam je otežala način izvedbe. Koronavirus je globalni problem i na nama je da se prilagodimo situaciji. Građevinski radnici iz Bosne i Hercegovine su napustili gradilišta, pa se i nekoliko dana nakon toga dogodila obustava opskrbe građevinskim materijalom. No, uspjeli smo sve vratiti u radnu fazu te su gradilišta sada aktivna. Jedno vrijeme je bila otežana nabava građevinskog materijala, što je kasnije ipak riješeno. Sve u svemu, napredujemo s radovima.

2. pitanje: Jeste li prilikom obnove naišli na neke zanimljivosti koje bi bilo vrijedno spomenuti?

Odgovor: Našli smo jedno bogatije nalazište koje je po mišljenju konzervatora možda vrijednije od cijelog ovog projekta. Nalazi se u blizini hotela Bastion. Pronašli smo lukove na dubini od oko 4-5m ispod površine zemlje i ispod lukova smo pronašli ostatke iz doba starog Rima. Gledano sa konzervatorskog dijela, to je jedno bogato nalazište. Zasad je nalazište još otvoreno, ali u ovoj fazi radova nas ne usporava. Naša dionica je duga oko jedan kilometar, a ovo je samo dio od sto kvadrata, tako da imamo što raditi.

Damir Martinov – Arheolog d.o.o.- arheološki radovi

1. pitanje: U kojem trenutku ste se uključili u ovaj projekt i je li nužno bilo uključiti arheologe u ovaj projekt?

Odgovor: Svega tri dana od početka radova na bedemima, na samom početku budućeg šetališta otkriveni su arheološki ostaci. Arheologe angažira naručitelj radova, odnosno investitor određenog projekta. O trenutku u kojem se angažiraju arheolozi odlučuje nadležni konzervatorski odjel, u slučaju zadarskih bedema, Konzervatorski odjel u Zadru. Nekada se unaprijed zna što se na nekom prostoru u povijesti nalazilo i na osnovu tih podataka konzervatorski odjel propisuje arheološke radove prije građevinskih radova. Isto tako postoje situacije gdje se sumnja da će se na određenim lokacijama pronaći vrijedni povijesni nalazi te konzervatorski odjel, u pravilu, uvjetuje prilikom bilo kakvih radova na tim lokacijama, arheološki nadzor, te ukoliko se nešto pronađe, arheološka istraživanja. Čim se pronašla tzv. „poštansku cestu“, osigurali smo taj dio i stavili sonde.

2. pitanje: Postoji li opasnost da arheološki nazali uspore radove na bedemima i uspore tijekom čitavog projekta i koliko ste zadovoljni odnosom investitora prema poslovima arheologa?

Odgovor: Sve je moguće. Tijek cjelokupnog rada ovisi o onome što se pronađe u našem istraživanju. Što se tiče dijela obnove bedema vezanog za arheološke radove mogu reći da



smo prezadovoljni, koliko samim pronalascima, toliko i odnosom investitora i svih nadzora prema svim arheološkim radovima i arheološkim nalazima.

Građani:

1. pitanje: Smatrate li da su parkirališna mjesta važnija od uređene šetnice koja je u planu projekta Zadar Baštini?

Odgovori: Smatram da će šetnica puno više pridonijeti gradu nego trenutna parkirna mjesta. Ima puno boljih rješenja za parkiralište. Na poluotoku uopće ne bi trebalo parkirati.

2. pitanje: Smatrate li da je ovaj projekt ono što Zadru treba?

Odgovor: To je sigurno nešto pozitivno. Uredit će se prostor za pješake, za obitelji. Prostor će biti zeleniji i mislim da je to dobro.

Vrednovanje

Stanje napredovanja istraživanog projekta na temelju prikupljenih informacija:

Projekt je još uvijek u tijeku i za sada su se pojavile poteškoće vezane uz obilne kiše, koje su omele radove. Bedemi su tijekom projekta stavljeni pod zaštitu UNESCO-a što je zahtijevalo izmjenu jednog dijela dokumentacije. Nakon toga, situacija s koronavirusom je usporila jedan dio radova te su se pojavile poteškoće s nabavom materijala koji je potreban za obnovu bedema. No, za sada su svi ispitanici pozitivni po pitanju rokova za završetak projekta i vrlo vrijednih rezultata. Također, vrijedni pronalasci su se pojavili tijekom izvođenja radova obnove bedema. Iako smo u medijima mogli pročitati kako je vrijednost projekta puno veća od predviđene, sugovornici su nam dali do znanja da je riječ upravo o situaciji kako su troškovi zapravo manji od procijenjenih. Ono što nam je promijenilo percepciju, koja je prisutna i u javnosti, jest to da smo ovaj projekt više gledali kao na turističku promociju, nego kao na novu mogućnost za građane. Upravo smo tijekom razgovora sa sudionicima prepoznali vrijednost obnove bedema kao ugodnog prostora za druženja upravo za građane grada Zadra, a tek onda za turiste. Smatramo da je to bitna stvar koja treba biti jače naglašena u promociji samog projekta. Da građani Zadra prepoznaju vrijednost obnove bedema za njih. Nadalje, tijekom istraživanja, tj. razgovora s građanima, ustanovili smo kako su oni većim dijelom suglasni s pretvaranjem bedema u šetnicu, za razliku od sadašnje prometnice. I to je nešto što se u medijima predstavljalo kao projekt koji isključivo ukida parkirališna mjesta, a građanima ništa ne daje zauzvrat. Građani su većim dijelom izrazili zadovoljstvo da se poluotok rastereti pretjeranog prometa. Svi sugovornici su uglavnom zadovoljni trenutnim stanjem i optimistični po pogledu daljnjih radova.



Rezultat istraživnog projekta (ako je projekt završen, koji su bili rezultati?): Projekt je još u tijeku. Paralelno se izvode radovi arheologa i radovi građevinske tvrtke Minigradnja d.o.o. Na samom početku budućeg šetališta otkriveni su arheološki ostaci s kojima se počela baviti tvrtka Arheolog d.o.o. Na početku ceste pronađena je tzv. „poštanska cesta“. Taj dio je osiguran i nad njim se radi sondiranje. Ispod svima poznatog asfalta postavljenog 1980-ih godina na pojedinim mjestima pronađen je asfalt iz 1950-ih i 1960-ih godina, vremena obnove grada nakon rušenja u Drugom svjetskom ratu. Sljedeći sloj je cesta iz vremena talijanske uprave, a ispod nje se nalaze spomenuti ostaci i tragovi poštanske ceste koja je dovršena 1878. godine. Ukupno je do sada istraženo 6 arheoloških sondi: 3 su istražene na samom početku radova kako bi se dobio uvid u slojeve i njihov i karakter, a pozicije i potreba za ostale 3 određene su u tijeku radova.

Ako je projekt završen ili ste pak bili u mogućnosti vrednovati neke od rezultata, kakva je prema vašem mišljenju učinkovitost istraživnog projekta? [jedan odgovor]

- Štetna intervencija – bilo je bolje ne izvesti je jer je prouzročila negativne posljedice
- Beskorisna intervencija – situacija se nije promijenila, bačen novac
- Korisna intervencija, ali ima problema – ima nekih pozitivnih rezultata i sve u svemu je korisna, iako ima neke negativne aspekte
- Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni aspekti i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom
- Nije bilo moguće vrednovati učinkovitost intervencije – istraživani projekt još nema rezultate koji se mogu vrednovati

Jake strane (što vam se sviđjelo u istraživnom projektu?): Svidio nam se ogroman povijesni značaj bedema kojeg nismo do sada bili svjesni. Zatim, nismo bili svjesni kompleksnosti projekta, tj. koliko posla ima unutar jednog projekta. Posebno nam je bilo zanimljivo vidjeti koliko različitih struka radi na jednom zadatku. Shvatili smo koliko je na radu na projektu važna interdisciplinarnost te smatramo da je ovdje ta suradnja (barem prema izjavama sugovornika) jaka strana projekta. Osim toga, djelatnici grada Zadra su nam posebno ukazali na važnost timskog rada u provedbi svakog projekta.

Što se tiče našeg ASOC projekta, jako nam se sviđjelo sudjelovanje u projektu i mislimo da je ovakva vrsta izvannastavnih aktivnosti uvijek dobrodošla zbog razvijanja kritičkog mišljenja i kreativnosti. Potiče učenike na zajednički rad. Uz ovakve projekte napravimo odmak od svakodnevnog školskog stresa.

Slabe strane (teškoće s kojima ste se sreli u pokretanju/izvođenju istraživnog projekta?):

Poteškoće na koje smo naišli tijekom projekta vezane su u nedostatak vremena za istraživanje. Uz svakodnevne školske obaveze i dodatne aktivnosti, ponekad je bilo teško organizirati susrete i obavljati sve zadatke na vrijeme. No, shvatili smo da je najvažnija dobra podijela poslova i interno zadavanje rokova. Situacija s koronavirusom nas je omela utoliko što nismo mogli odraditi prema planu treću fazu projekta- zajednički izlazak na teren. No, uspjeli smo se



organizirati, podijeliti po zadaćama i odraditi intervju putem Skype-a, Whats App-video poziva, telefonskim putem ili elektroničkom poštom. Tako smo naučili da okolnosti nikad nisu idealne te da im se treba prilagoditi na najbolji mogući način.

Inače, ono što smo uočili kao slabe strane samog projekta Zadar Baštini je sljedeće: činjenica da je projekt obnove bedema usmjeren samo na pješački dio, na površinski sloj. Vrlo je vjerojatno da će se u budućnosti pojaviti potreba za obnovom i ostalih dijelova bedema.

Kao najveći problem u radovima pokazao se nedostatak prethodnih istražnih radova, tako da je većina onoga što se nalazilo ispod postojećeg asfalta predstavljalo nepoznanicu, a neke poznati elementi se nisu uzeli u obzir, zbog čega se projekt morao mijenjati u hodu.

[AKO JE ODGOVOR „štetna intervencija”, „beskorisna intervencija”, „korisna intervencija, ali ima problema”]

Koji su uzroci neučinkovitosti projekta koji ste istraživali? [moguće više odgovora]

- U izvođenju su se pokazali problemi administrativne prirode
- U izvođenju su se pokazali problemi tehničke prirode
- Rezultat projekta nije zadovoljavajući
- Intervencija koja je u cjelini dobro izvedena, ali ne odgovara potrebama krajnjih korisnika (nije učinkovita)
- Korisna intervencija, ali nije dovoljna da odgovori na osnovne potrebe („potrebno je više”, npr. više ulaganja u isti projekt ili slične projekte)
- Intervencija koja je sama po sebi korisna, ali potrebne su druge, dopunske intervencije

Budući rizici za istraživani projekt:

Situacija s koronavirusom je nepredvidiva- postoje poteškoće s nabavkom materijala potrebnog za sanaciju bedema i nedostatka radne snage.

Postoji rizik da građani ne prepoznaju vrijednost projekta. Smatramo da je ovaj naš projekt na bitan način doprinio „vidljivosti” projekta „Zadar Baštini” građanima.

Budući da je riječ samo o parternom uređenju bedema, tj. samo o površinskom dijelu, to bi se u budućnosti (ukoliko neće biti dodatnih obnova) moglo pokazati kao poteškoća. Osim toga, smatramo da ne bi smjelo doći do pretjerane komercijalizacije prostora kada se postave kućice na Muraju.

Rješenja i ideje koje želite predložiti za istraživani projekt:

Više pozornosti posvetiti informiranju javnosti. Riješiti problem parkirnih mjesta na poluotoku.

Sljedeći projekti trebali bi biti usmjereni na obnovu čitavih bedema radi opasnosti od dotrajalosti donjeg dijela.



Kratko mišljenje o istraživanom projektu:

Tek je počeo Premalo je vremena prošlo od početka istraživanog projekta da bih mogao/la izraziti mišljenje. Zna se da je započeo, iako rezultati nisu još vidljivi i ne mogu se pratiti.

U tijeku i dobro napreduje Istraživani projekt započeo je i, sve u svemu, djelomični rezultati čine se pozitivnima. Čini se da sve (ili barem najveći dio) započete aktivnosti idu u planiranom smjeru. Svi sudionici projekta su zadovoljni dosadašnjim tijekom te su pozitivni po pitanju budućih aktivnosti. Bilo je poteškoća tijekom provedbe, ne one su otklonjene i projekt lijepo napreduje.

Napredak uz teškoće Istraživani projekt je započeo, ali uočeni su problemi u njegovom pokretanju (npr. znatna kašnjenja, neke su aktivnosti zaustavljene ili postoje neke znatne razlike u odnosu na predviđeno).

Blokiran Istraživani projekt ne napreduje. Može biti blokiran na početku (nikad nije započeo) ili u nekoj kasnijoj fazi.

Završen i koristan Istraživani projekt je završen i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitim.



Završen i neučinkovit Istraživani projekt je završen, ali smatra se sveobuhvatno neučinkovitim (npr. nedostaju druge dopunske intervencije, projekt je završen, ali nije ušao u funkciju, ili nije funkcionalan, zastario je ili u svakom slučaju ne odgovara na potrebe korisnika).

Poveznice, videozapisi, prilozi

Dodajte slike, dokumente itd.


<https://www.youtube.com/watch?v=nx5YfvVZUSs&feature=youtu.be>

<https://drive.google.com/file/d/1MeSmKTGtbsIIS5SNHn6xjHGOwYgovQwa/view?usp=sharing>

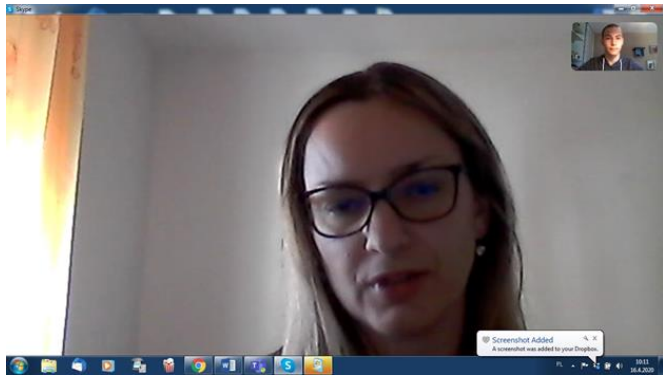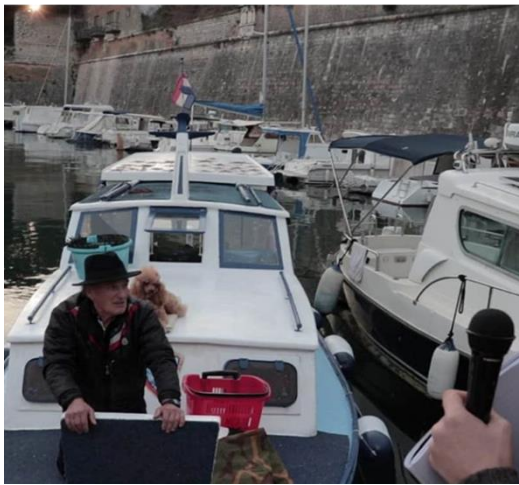





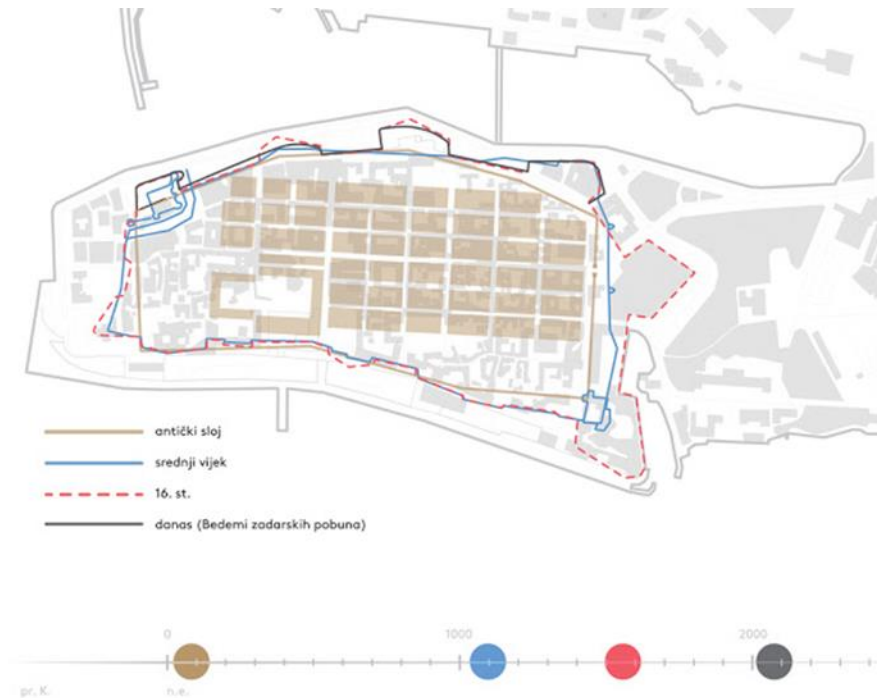

3. korak – Rezultati i utjecaj – Kako je završilo?

Novi kontakti i veze koje ste stvorili

Djelatnici Grada Zadra, Agencije Zadra Nova, Konzervatorski odjel Zadar, Minigradnja d.o.o, Arhitekt Bogdan Marov, arheolog Damir Martinov

Kako ste priopćili/dijelili ili priopćavate/dijelite rezultate svog građanskog praćenja?

- Twitter: <https://twitter.com/AkcijaEdu>
- Facebook: <https://www.facebook.com/eduakcija.mioc/>
- Instagram: <https://www.instagram.com/eduakcija.mioc/>
- Teritorijalna događanja koja organizira ASOC tim
- Tjedan otvorene vlasti
- Blog / mrežna stranica ASOC tima: <https://eduakcijamioc.wordpress.com/>
- Distribucija letaka ili drugi izvanmrežni načini (ne putem interneta)
- Zahtjev za predstavljanjima ili sastancima iza zatvorenih vrata
- Intervjui s predstavnicima medija: **ZADARSKI LIST**
- Drugo: **Virtualna školska knjižnica**
Dopis medijima

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=nx5YfvVZUSs&feature=youtu.be>



Power Point zvučna prezentacija:

https://drive.google.com/drive/folders/19AGvILSadyt9zzITxy_YAsUuJghJNVsq

S kojim ste ispitanicima kontaktirali radi razgovora o rezultatima svog istraživanja?

Ispitanik [slobodan tekst]	Uloga [slobodan tekst uz natuknicu]	Organizacija [slobodan tekst uz natuknicu]	Vrsta veze [zatvoren izbornik]
Stefani Mikulec Perković	Voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizama	Grad Zadar	Intervju E-mail
Ante Ćurković	Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za EU fondove	Grad Zadar	Intervju- Skype
Marija Dušević	Viša savjetnica	Zadra Nova /EDIC	E-mail, telefonski poziv
Marija Bosnić	Voditeljica Odsjeka za strateško planiranje i koordinaciju razvoja Zadarske županije	Zadra Nova	Skype- intervju
Katina Vrsaljko	Novinarka	Zadarski list	E-mail Telefonski poziv
Antonio Perica	Tehnički direktor	Minigradnja d.o.o.	E-mail Telefonski poziv
Mihovil Kardum	Voditelj radova	Minigradnja d.o.o.	Whats App video-poziv
Damir Martinov	Arheolog	Arheologija d.o.o.	E-mail

Napomena:

Vrsta vezeu

- *Intervju (napravljen ili primljen)*
- *Zajedničko sudjelovanje na javnom događanju*
- *Sudjelovanje na predstavljanju / sastanku iza zatvorenih vrata*



- Kontakt elektroničkom poštom ili telefonom
- Sudjelovanje na institucijskom događanju (npr. sastanku nadzornog odbora, županijskom/gradskom/općinskom vijeću itd.)
- Drugo: navedite

Uloga: navedite ispitanike s kojima ste bili u kontaktu radi priopćavanja rezultata svog nadzora ili razgovora o njima.

Primjer: gradonačelnik, predsjednik, javni dužnosnik, novinar, opunomoćeni upravitelj poduzeća itd.

Organizacija: primjeri: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Jutarnji list, novinar/rubrika za koju piše/izvještava

Rezultati i utjecaj građanskog praćenja

Mediji su izvještavali o vašem istraživanju? Da/ ne

<https://www.zadarskilist.hr/clanci/20042020/promatraci-iz-siene-zadarska-bastina-pod-eu-zvijezdama>

<https://www.zadabastini.hr/novosti/zadarska-bastina-pod-eu-zvijezdama>

<https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/zadar-plus/gimnazija-franje-petrica-prikljucila-se-eu-projektu-a-zbog-toga-ce-pomno-pratiti-izvedbu-i-tijek-radova-projekta-zadar-bastini-1016117>

<http://www.rivaon.com/>

<http://m.057info.hr/vijest/ucenici-mioc-a-prate-provedbu-obnove-zadarskih-bedema/124580.html>

<https://infokiosk.net/gimnazija-franje-petrica-prikljucila-se-eu-projektu-a-zbog-toga-ce-pomno-pratiti-izvedbu-i-tijek-radova-projekta-zadar-bastini/>

Tijela javne uprave odgovorila su na vaše upite ili reagirala na probleme na koje ste ukazali?

Sve institucije kojima smo se obratili su nam odgovorili i vrlo rado pristali na suradnju. Bili su otvoreni za sva naša pitanja i vrlo susretljivi. Davali su nam vrlo opširne dogovore i ponudili nam suradnju nakon što završi opasnost od koronavirusa. Dogovor je s djelatnicima Grada Zadra te tvrtke Minigradnja i konzervatorice Barbare Peranić da zajedno obiđemo teren, bez obzira na mogući već završetak ovog našeg ASOC projekta.



- Nisu odgovorila
- Neka su odgovorila, druga nisu
- Dala su nam službene ili generičke odgovore
- Barem jedno od tijela kojima smo se obratili dalo nam je konkretna obećanja
- Provela su u praksi naše prijedloge i projekt je sad „deblokiran” ili učinkovitiji
- Ukazali smo na problem koji je sad riješen
- Drugo: ...

Opišite nam vaše istraživanje. Koje vas konkretne činjenice ili događaji navode na mišljenje da je vaše građansko praćenje imalo (ili nije imalo) utjecaja na ispitanike koji upravljaju projektom koji ste istraživali ili ga pokreću?

Da je naše građansko praćenje imali utjecaja na osobe zadužene za upravljanje projektom mogli smo zaključiti iz njihove spremnosti da nam izađu ususret tijekom istraživanja. Svi sugovornici su izražavali zadovoljstvo činjenicom da smo se uključili u praćenje projekta Zadar Baštini. Posebno ćemo pritom spomenuti odluku voditelja projekta, djelatnika Odjela za EU fondove da tijekom i rezultate našeg istraživanja postavimo na službene stranice projekta. Osim što su naši sugovornici bili izuzetno susretljivi, i njima samima se svidjela mogućnost promišljanja o projektu na drugačiji način. Pritom mislimo da činjenicu da je našim oglašavanjem o projektu na društvenim mrežama i sam projekt Zadar Baštini postao „vidljivijim“ široj zajednici. Ne samo stručnoj zajednici, nego i građanima radi kojih se u konačnici ovaj projekt i provodi.

Da smo ostvarili dobar i jak dojam, potvrđuje to da su nas kontaktirali novinari svih većih lokalnih medija (Slobodna Dalmacija, Zadarski list, 057 info) te mrežna stranica srednjih škola zadarske županije (rivaon.hr) kako bi izvijestili o rezultatima našeg projekta. Učenik Jakov Zorić je pozvan od strane novinarki Zadarskog lista na intervju u kojem je iznio svoja iskustva sudjelovanja u ASOC projektu. Sve je to doprinijelo otvorenosti projekta lokalnoj zajednici na što su pozitivno reagirali svi sudionici projekta Zadar Baštini s kojima smo ostvarili kontakt: Grad Zadar, Agencija ZadraNova, Konzervatorski odjel Zadar, Minigradnja d.o.o., arheolog Damir Martinov i arhitekt Bogdan Marov.

Završni korak – spremanje i slanje

Izvešće je spremno za pregled redakcije koja će ga objaviti ako je u skladu s našim uvjetima korištenja.
